


Иерархическая структура работ (ИСР)

Проект «Первый глоток. Предзаказ»

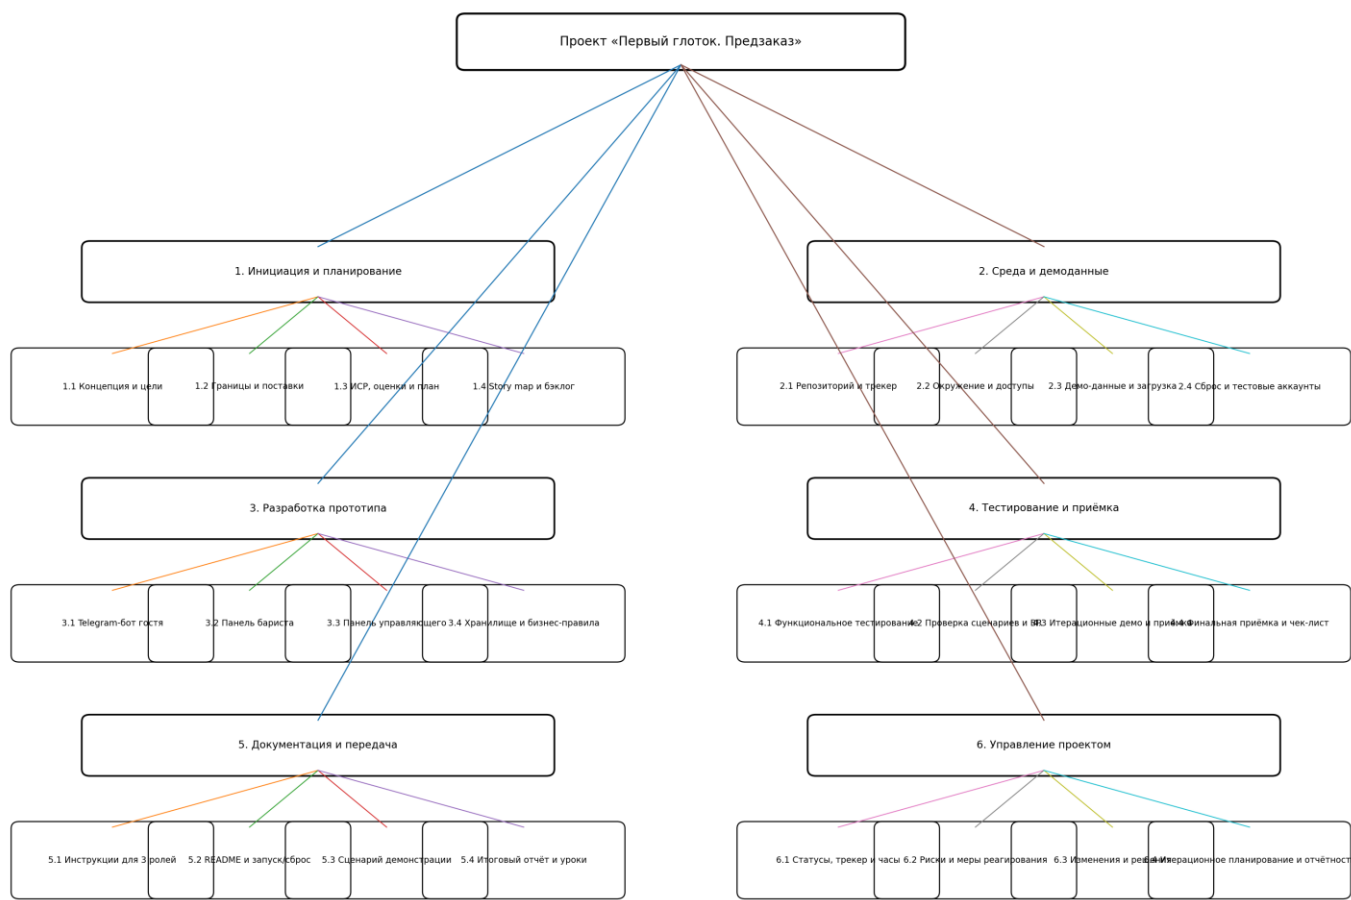

Уровень 1 — проект Уровень 2 — основные направления работ Уровень 3 — листовые пакеты работ

3 уровня • 24 пакета работ (листовых узлов)

1. Принцип декомпозиции

Выбран комбинированный принцип декомпозиции: на втором уровне ИСР используется преимущественно функционально-результатный принцип, а внутри областей учитываются этапы жизненного цикла проекта. Такой вариант подходит для данного прототипа, потому что в ТЗ одновременно заданы конкретные поставки, роли и функциональные требования, а также обязательные управленческие, приёмочные и документальные работы.

На верхнем уровне выделены шесть областей: инициация и планирование; подготовка среды и демо-данных; разработка прототипа; тестирование и приёмка; документация и передача; управление проектом. На третьем уровне каждая область разложена на законченные пакеты работ, которые можно оценить, назначить исполнителю, включить в расписание и связать с конкретным результатом.

Декомпозиция намеренно не ограничивается созданием Telegram-бота и панелей. В неё включены подготовка окружения и доступа к трекеру, создание и сброс демонстрационных данных, проверка бизнес-правил и альтернативных сценариев, итерационные демонстрации, приёмка, инструкции, README, сценарий демонстрации, журналы рисков/изменений и итоговый отчёт.

2. Расшифровка пакетов работ

Код	Пакет работ	Содержание	Уровень
1.1	Концепция и цели	Зафиксировать проблему, цели проекта, роли и целевой сквозной сценарий.	3 — листовой узел
1.2	Границы и поставки	Зафиксировать, что входит/не входит в прототип, заглушки и перечень поставок.	3 — листовой узел
1.3	ИСР, оценки и план	Сформировать ИСР, оценки пакетов, зависимости, календарный план и базовые контрольные точки.	3 — листовой узел
1.4	Story map и бэклог	Разложить сценарии и требования по ролям, приоритетам и итерациям.	3 — листовой узел
2.1	Репозиторий и трекер	Создать рабочее пространство проекта, настроить доступ заказчика и структуру задач.	3 — листовой узел
2.2	Окружение и доступы	Подготовить инструменты, тестовый бот/панели, секреты и необходимые доступы без хранения паролей в репозитории.	3 — листовой узел
2.3	Демо-данные и загрузка	Подготовить меню, тестовые аккаунты, эталонные заказы и механизм начальной загрузки.	3 — листовой узел
2.4	Сброс и тестовые аккаунты	Обеспечить воспроизводимый сброс демо-состояния и подготовленные аккаунты для ролей.	3 — листовой узел
3.1	Telegram-бот гостя	Реализовать согласие, меню, модификаторы, корзину, слот, оплату-заглушку, подтверждение и уведомления.	3 — листовой узел
3.2	Панель бариста	Реализовать очередь по слотам, статусы, поиск заказа и быстрый стоп-лист.	3 — листовой узел
3.3	Панель управляющего	Реализовать управление меню, ценами, слотами, нагрузкой и дневной сводкой.	3 — листовой узел
3.4	Хранилище и бизнес-правила	Реализовать хранение заказов и общие правила BR-1—BR-18, ролевой доступ и демо-время.	3 — листовой узел
4.1	Функциональное тестирование	Проверить Must/Should-функции на тестовых данных и исправить выявленные дефекты.	3 — листовой узел
4.2	Проверка сценариев и BR	Проверить happy path, AS-1—AS-7, ограничения слотов, статусы, отмены, просрочки и стоп-лист.	3 — листовой узел
4.3	Итерационные демо и приёмка	Проводить демо И1—И4, фиксировать замечания и результаты принятия инкрементов.	3 — листовой узел
4.4	Финальная приёмка и чек-лист	Провести полный чек-лист АС,	3 — листовой узел

		сверить Must/Should и подготовить итоговую приёмку.	
5.1	Инструкции для 3 ролей	Подготовить краткие инструкции для гостя, бариста и управляющего.	3 — листовой узел
5.2	README и запуск/сброс	Описать запуск, настройку и сброс так, чтобы заказчик мог выполнить их самостоятельно.	3 — листовой узел
5.3	Сценарий демонстрации	Подготовить сквозной и альтернативные сценарии, последовательность показа и тестовые данные.	3 — листовой узел
5.4	Итоговый отчёт и уроки	Сравнить обещанное и полученное, зафиксировать отклонения, риски и уроки проекта.	3 — листовой узел
6.1	Статусы, трекер и часы	Вести задачи, фактические часы, статусы и прозрачность выполнения работ.	3 — листовой узел
6.2	Риски и меры реагирования	Вести реестр рисков, признаки, реакции и актуализацию мер на протяжении проекта.	3 — листовой узел
6.3	Изменения и решения	Вести журнал изменений и решений, оценивать влияние на объём, сроки и стоимость.	3 — листовой узел
6.4	Итерационное планирование и отчётность	Планировать следующую итерацию и готовить статус с CV, SV, EAC, VAC, velocity, рисками и изменениями.	3 — листовой узел

3. Соответствие требованиям задания

Проверка	Результат
Количество уровней	3: проект → области работ → пакеты работ.
Количество листовых узлов	24, что соответствует требованию порядка 20–25.
Производство продукта	Telegram-бот, панель бариста, панель управляющего, хранилище и бизнес-правила.
Подготовка среды	Репозиторий, трекер, окружение, доступы и тестовые аккаунты.
Демонстрационные данные	Подготовка, загрузка и сброс демо-данных.
Сопроводительные материалы	Инструкции, README, сценарий демонстрации, итоговый отчёт.
Приёмочные процедуры	Функциональные проверки, проверка сценариев/BR, итерационные демо и финальная приёмка.
Управленческие работы	Трекер и часы, риски, изменения/решения, итерационное планирование и статусная отчётность.

Основание: ТЗ проекта «Предзаказ» для кофейни «Первый глоток»: разделы 5.2, 6, 7, 8, 10–11 и приложение А. Структура ИСР оставлена на усмотрение исполнителя, при этом задание требует не менее 3 уровней и 20–25 пакетов работ.
